

# 委託技術服務作業要領 與常見爭議

114年12月05日

# 課程大綱

- 最近修法情形
- 工程生命週期思考
- 招標階段
  - 服務項目 / 費用
  - 廠商資格 / 細則**38**
  - 評選優勝廠商
- 履約管理階段
  - 服務費用之變更
  - 逾期違約金

# 最近修法情形

## ○ 機關採購工作及審查小組設置及作業辦法§5.3

(1140428修正)

- 本小組開會時，.....；並應通知機關主（會）計及政風單位列席，依權責協助提供意見。

## ○ 機關委託技術服務廠商評選及計費辦法§23.1.2

(1140523修正)

- 機關與評選優勝廠商之議價，應依下列方式辦理，並載明於招標文件：

二、優勝廠商有二家以上者，依優勝順序，自最優勝者起，依序以議價方式辦理。但有二家以上廠商為同一優勝順序者，擇配分最高之評選項目之得分合計值較高者，優先議價；如配分最高之評選項目有兩項以上者，以該等項目得分合計值較高者，優先議價；得分仍相同者，就該等廠商再進行綜合評選一次，以總評分最高、價格與總評分之商數最低或序位合計值最低者，優先議價；其再次相同者，抽籤決定之。

# 工程生命週期思考



計畫未扣合需求定位  
或

評選方案未扣合計畫


工期預算與實際脫節

未善用適當採購策略

未即時有效解決問題

流標	變更	展延
V	V	V
V	V	V
V	V	V
V		
	V	V

# 工程生命週期思考(續)

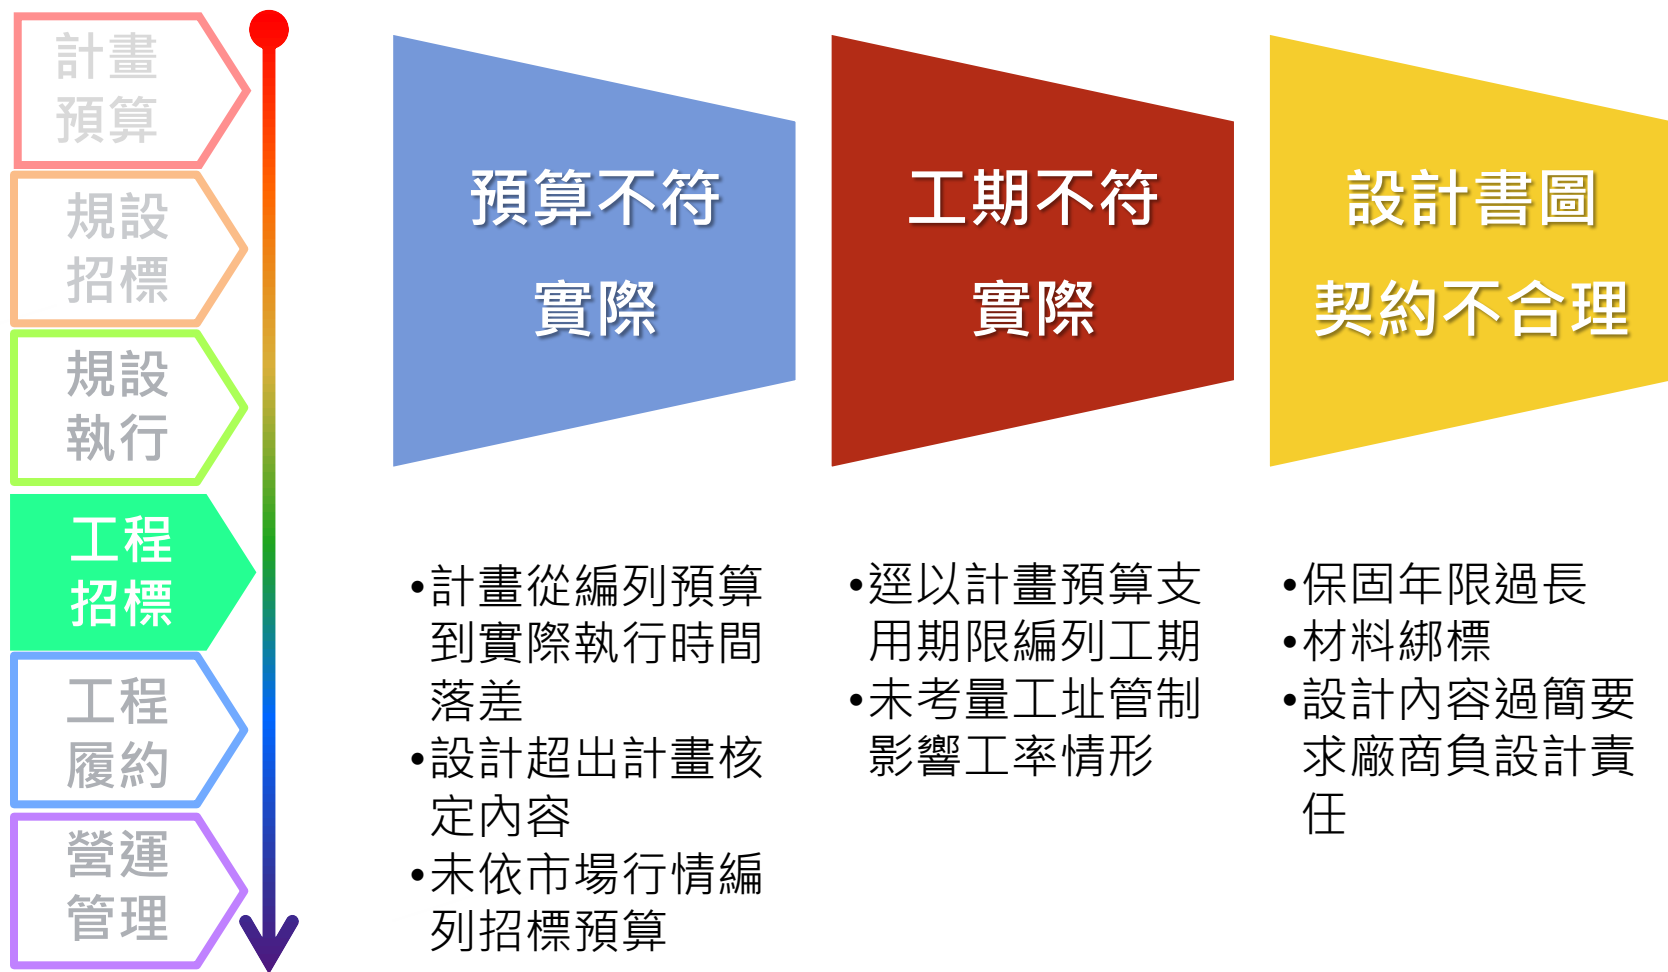

# 技術服務採購服務項目-案例

---

- 某機關辦理140萬元之鋼棚架工程，因涉及**環境影響評估**之檢討(約20多萬元)，擬將環評檢討一併委託設計監造，可否？

# 技術服務之計費方式

## ○技服辦法第25條第1項

- 機關委託廠商辦理技術服務，其服務費用之計算，應視技術服務類別、性質、規模、工作範圍、工作區域、工作環境或工作期限等情形，就下列方式擇定一種或二種以上符合需要者訂明於契約：
  - 一、服務成本加公費法。
  - 二、建造費用百分比法。
  - 三、按月、按日或按時計酬法。
  - 四、總包價法或單價計算法。

## ○技服辦法第25條之1(109.9.9新增)

- 機關委託廠商辦理技術服務，其服務費用得就履約期間各種技術服務工作事項所需人力之類別、人數、工作時間、薪資，及人力以外之其他相關費用，合理估算後編列預算，並作為擇定前條服務費用計算方式之參考。

# 建造費用百分比法

## ○技服辦法第29條第1項(109.9.9修正)

修正條文	現行條文
<p>機關委託廠商辦理技術服務，服務費用採<u>建造費用百分比法</u>計費者，其服務費率應按工程內容、服務項目及難易度，<u>參考附表一至附表四，訂定建造費用之費率級距及各級費率</u>，簽報機關首長或其授權人員核定，<u>並於招標文件中載明</u>。服務項目屬附表所載不包括者，其費用不含於建造費用百分比法計費範圍，<u>應單獨列項</u>供廠商報價，<u>或</u>參考第二十五條之一規定估算結果，於招標文件中<u>載明固定費用</u>。</p>	<p>機關委託廠商辦理技術服務，服務費用採建造費用百分比法計費者，其服務費率應按工程內容、服務項目及難易度，<u>依附表一至附表四所列百分比以下酌定之，並應按各級建造費用，分別訂定費率，或訂定統一折扣率；其屬特殊情形或需要高度技術之服務案件，致有超過各附表所列百分比之必要者，應敘明理由</u>，簽報機關首長或其授權人員核定。</p>



# 建造費用百分比法<sub>(續)</sub>

## ○技服辦法第29條第2項<sub>(未修正)</sub>

- 前項建造費用，指經機關核定之工程採購底價金額或評審委員會建議金額，不包括規費、規劃費、設計費、監造費、專案管理費、物價指數調整工程款、**營業稅**、土地及權利費用、法律費用、主辦機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息、保險費及招標文件所載其他除外費用。

# 建造費用百分比法<sub>(續)</sub>

## ○技服辦法第29條第3項及第4項<sub>(109.9.9修正)</sub>

修正條文	現行條文
<p>工程採購無底價且無評審委員會建議金額者，第一項建造費用以<b>工程預算代之</b>。但應扣除前項不包括之費用及稅捐等。</p> <p>第一項工程於履約期間有契約變更、終止或解除契約之情形者，服務費用得視實際情形協議增減之。<u>其費用之計算由雙方協議依第二十五條規定之方式辦理。</u></p>	<p>工程採購無底價且無評審委員會建議金額者，第一項建造費用以工程預算之百分之九十代之。但應扣除前項不包括之費用及稅捐等。</p> <p>第一項工程於履約期間有契約變更、終止或解除契約之情形者，服務費用得視實際情形協議增減之。</p>

# 建造費用百分比法(續)

- 參考附表一各級建造費用之計算
  - 屬第一類建築工程，其建造費用預估6億元，技術服務費用估算如下：

建 造 費 用	服務費率 參考(%)	計 算 式	各級服務 費用
500萬元以下	8.6	$500 \times 8.6\% =$	43萬元
500萬元至1,000萬元	8.0	$(1,000 - 500) \times 8.0\% =$	40萬元
1,000萬元至5,000萬元	6.9	$(5,000 - 1,000) \times 6.9\% =$	276萬元
5,000萬元至1億元	5.8	$(10,000 - 5,000) \times 5.8\% =$	290萬元
1億元至5億元	4.6	$(50,000 - 10,000) \times 4.6\% =$	1,840萬元
超過5億元	3.7	$(60,000 - 50,000) \times 3.7\% =$	370萬元
		合 計	2,859萬元

# 技術服務廠商資格-案例1

- 某機關辦理一室內裝修案，室內裝修設計業者可否從事該室內裝修之監造工作？

建築物室內裝修管理辦法 第5條

室內裝修從業者業務範圍如下：

- 一、依法登記開業之建築師得從事室內裝修設計業務。
- 二、依法登記開業之營造業得從事室內裝修施工業務。
- 三、室內裝修業得從事室內裝修設計或施工之業務。

# 技術服務廠商資格-案例2

- 某機關辦理地下停車場新建工程委託**專案管理(含監造)**技術服務案，廠商資格為工程技術顧問公司(營業登記範圍包括土木或結構)、建築師事務所、土木或結構技師事務所。停車場由統包工程廠商之建築師設計，建築執照及使用執照皆由建築師為之。
- 投標須知載明主要部分為：
  1. 工程執行計畫書
  2. 工程先期作業階段之技術服務
  3. 統包廠商招標、決標之準備與協助執行
  4. 工程設計之諮詢及審查
  5. 工程施工監造之技術服務

# 技術服務廠商資格-案例3

- 某衛生所辦理建築物耐震補強及廳舍修繕工程委託規劃、設計及監造服務案，招標公告投標廠商之基本資格：

(一)建築師事務所

(二)技師事務所

發文日期：中華民國八十九年三月一日

發文字號：(八九)工程企字第八九○○三○○二號

主旨：各機關委託技術服務案件辦理招標，有關投標廠商資格之規定不應排除技師事務所，請查照並轉知所屬(轄)機關。

說明：

二、依政府採購法第八條之規定：「本法所稱廠商，指公司、合夥或獨資之工商行號及其他得提供各機關工程、財物、勞務之自然人、法人、機構或團體」。而「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第三條則規定：「本辦法所稱技術服務，指建築師事務所、技師事務所、技術顧問機構及其他依法令得提供技術性服務之自然人或法人所提供之規劃、設計、監造或管理等服務」，另依技師法第六條規定，技師單獨設立技師事務所、與其他技師組織聯合技師事務所、受聘於技術顧問機構或組織技術顧問機構，均為其執行業務方式，故各機關辦理委託技術服務案件，有關投標廠商資格之規定，不應排除技師事務所參與，以符合政府採購法第三十七條第一項不得當限制競爭及技師法第六條、第十二條之規定。

# 細則第38條-案例1

- 某機關辦理建築物耐震補強工程，其**先期之耐震詳細評估**之技師，渠為負責人之顧問公司能否參加該機關就該建築物耐震補強工程所辦之規劃設計監造技術服務招標？

採購法施行細則第38條

機關辦理採購，應於招標文件規定廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：

一、提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。 ... ..(第1項)

前項第一款及第二款之情形，於無利益衝突或無不公平競爭之虞，經機關同意者，得不適用於後續辦理之採購。(第2項)

發文日期：中華民國100年1月17日

發文字號：工程企字第10000022450號

根據政府採購法 第三十九條

本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科 鍾 (先生或小姐)

主旨：關於政府採購法(下稱本法)第39條及其施行細則第38條之適用疑義一案，復如說明，請 查照。

說明：

一、貴局99年12月31日傳真函收悉。

二、關於本法施行細則第38條第1項各款所稱「廠商」，法無明文規定及於廠商之人員。

三、來函所述甲、乙二人為所詢系統建置案之規劃及專案管理廠商(Y廠商)之人員，現又為該系統建置案之投標廠商(A廠商)所提計畫書之協同主持人及執行組員，倘該二人非同時為Y廠商及A廠商之「負責人或合夥人」，則非屬本法第39條第2項規定事項，惟仍請注意同條第3項所定廠商間不得同時為關係企業之規定。所稱「負責人或合夥人」，請查察公司法第8條及商業登記法第10條規定。

四、本案甲、乙二人情形，縱無違反本法第39條及其施行細則第38條第1項規定；惟渠等曾參與該系統建置案之規劃工作，且該規劃內容並未完整公開，現又為該系統建置案投標廠商之「協同主持人」及「執行組員」，有造成不公平競爭之虞。



## 細則第38條-案例2

- 某縣政府107年11月間辦理提升道路品質計畫之設計技術服務案，為未達公告金額之採購，擬採限制性招標邀請原計畫提案廠商，是否不適用採購法施行細則第38條第1項第1款或有違反之虞？

## 細則第38條-案例3

- 機關辦理專案管理(含基本設計)、統包工程(含細部設計)及監造技術服務等三案辦理。
- 如統包商之細部設計顧問(分包廠商)，因細部設計成果係由專案管理技術服務廠商辦理審查，與監造之角色並無衝突，是否得同時參與機關辦理該統包工程之監造技術服務案？

發文日期：中華民國99年2月6日

發文字號：工程企字第09900006920號

根據政府採購法 第三十六條

本解釋函上網公告者：本會企劃處 第三科 陳 (先生或小姐)

主旨：貴府執行「中港大排污染改善暨河廊環境營造工程公共藝術設置計畫」，專業代辦廠商聘請之專案顧問是否可擔任邀請比件案之受邀策展人乙節，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴府99年1月6日北府水污工字第0981121781號函。

二、關於貴府依「公共藝術設置辦法」辦理旨揭計畫邀請比件之執行疑義，宜由該辦法之主管機關行政院文化建設委員會釋疑。

三、貴府依該辦法第22條規定，於公共藝術徵選結果報告書經核定後，依政府採購法（以下簡稱本法）第22條第1項第2款規定採限制性招標方式辦理時，關於本法施行細則第38條執行疑義，說明如下：

（一）本法施行細則第38條第1項各款所稱「廠商」，法無明文規定及於分包廠商。

（二）至於分包廠商參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商是否有利益衝突或不公平競爭之情形，應由機關視個案實際情形審認之。如經機關檢討有利益衝突或不公平競爭之情形者，請於招標文件預為載明，該分包廠商不得參加該個案投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商，以維護公共利益及公平合理原則。

# 資格 vs 評選項目

---

- 投標廠商特定資格vs最有利標評選
  - 納為評選項目後即不稱為特定資格(不受特殊或巨額採購之限制)
  - 可據以比較廠商之優劣及給分

# 資格 VS 評選項目(續)

## ○實績納為評選項目如何計分？

### ● 僅憑實績多寡恐有盲點

(二) 承上，機關既將廠商實績列入評選，就不良實績亦應考量，惟按工作小組之初審意見，未至本會「公共工程標案管理系統」之「重大工安事件」乙項查詢「最近五年發生重大職災之公共工程清單」內廠商有無不良紀錄，例如該廠商曾於105年 月承攬「 大樓新建 工程」發生灌漿工程時模板倒塌壓垮施工架有 人死亡之重大工安事故，核有未妥。

# 技術服務評選優勝廠商-案例1

- 某縣政府辦理委託設計監造技術服務案，依採購法§22.1.9辦理公開評選，共2家廠商投標，經審查均符合招標文件資格條件，評選結果與優勝廠商議價決標。

廠商編號	評選委員編號								累計總分	平均分數
	1	2	3	4	5	6	7	8	累計序位	優勝名次
廠商1 標價(折扣率) 99.77%	74	86	83	67	84	67	79	81	621	77.625
	1	1	1	0	1	2	1	1	8	1
廠商2 標價(折扣率) 90%	72	85	77	68	81	67	75	79	604	75.5
	2	2	2	0	2	2	2	2	14	2

# 技術服務評選優勝廠商-案例1 (續)

- 評選會議紀錄顯示，統計後雖有發現評選委員結果有明顯差異，惟因部分委員評選後即因有事先行離席，未及邀集全數出席委員討論，嗣經電話向先離席委員逐一說明上開結果，並取得半數以上委員同意依評選結果辦理。
- 資格審查紀錄，主持人為代理人。
- 決標紀錄載明依採購法第52條第1項第1款規定辦理。

# 技術服務評選優勝廠商-案例2

- 某機關辦理建築物興建工程設計監造委託技術服務案，依採購法§22.1.9辦理公開評選，採固定費用(率)給付，價格納入評選。

招標機關(以下簡稱機關)及得標廠商(以下簡稱廠商)雙方同意依政府採購法(以下簡稱採購法)及其主管機關訂定之規定訂定本契約，共同遵守，其條款如下：

履約標的表：

標項	項次	標 的 名 稱	規 格	單 位	數 量	單 價	複 價
	壹	工程設計監造「委託技術服務」		全	1	24,000,000	24,000,000
小 計							24,000,000
營業稅 5 %							1,200,000
總 計							25,200,000
新臺幣： 貳仟伍佰貳拾萬元(含稅)							



# 技術服務評選優勝廠商-案例2(續)

## 招標文件估價總表

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	技術服務費					
一						
二						
	合計(一十二)					
貳	營業稅					
	總計 報價總額 新台幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整					

## 優勝廠商建築師事務所估價總表

項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	技術服務費					
一	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 1em; margin-bottom: 2px;"></div> 「工程設計監造」委託技術服務」	式	1	25,048,800	25,048,800	
	合計				25,048,800	
	總計 報價總額 新台幣 貳仟 伍佰 零拾 肆萬 捌仟 捌佰 零拾 零元整					

※注意事項：

1. 投標廠商請自行依本表格式製作填寫。
2. 因本案屬固定費用，在評選項目「價格」20分，建議廠商提出如服務成本加公費法之用人月等之薪資，以利判斷其合理性與組成性據以評分。

# 技術服務評選優勝廠商-案例3

- 機關109年辦理委託專案管理技術服務，**評估**建造費用為新臺幣(下同)18億餘元，為依建造費用百分比上限累計之服務費用金額乘以折數後，再加上固定費用後，公開**預算金額為4,500萬餘元**，且載明標價超過預算者為不合格標，不予減價機會。  
招標文件未公告本案建造費用。
- 招標文件之契約載明服務費用計價方式係採建造費用百分比法，且採固定費率計算；即以議價後之費率及工程完成時之實際施工費用作為契約價金計價方式。

# 技術服務評選優勝廠商-案例3<sub>(續)</sub>

- 招標文件載明評定方式採用「序位法」，但有2家以上廠商為同一優勝序位者，以標價低者優先議價；若標價仍相同者，依序以配分最高之評選項目得分較高者優先議價；仍相同者，抽籤決定之。
- 評選結果2家投標廠商為同一優勝序位，廠商囿於建造費用未公告僅可於撰寫服務建議書自行估算。甲廠商於服務建議書填具固定費率2.3%較乙廠商2.5%為低，惟因甲廠商所估算之建造費用較高，導致其服務費用高於乙廠商，優先議價權？

# 技術服務評選優勝廠商-案例4

- 機關依採購法第22條第1項第9款辦理規劃設計公開評選優勝廠商，未訂底價（固定費用）準用最有利標案件，於公開評選後發現序位第1優勝廠商有採購法第50條第1項第2款情形(不符招標文件規定)而不決標予該廠商，後續議價程序？

# 其他招標文件訂定重點-與審標有關

## ○ 投標須知範本第77點之(7)切結書

□(7)技術服務或工程採購案，「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」及廠商切結書(行政院公共工程委員會101年1月13日工程企字第10100017900號函修訂)：

□切結書1

□切結書2(工程技術顧問公司執業技師)

□切結書3(營造業專任工程人員)

□切結書4(營造業工地主任)

# 工程變更之技術服務費用疑義

- 技服辦法第29條第4項規定：「第一項工程於履約期間有契約變更、終止或解除契約之情形者，服務費用得視實際情形協議增減之。其費用之計算由雙方協議依第二十五條規定之方式辦理。」
- 機關依前揭規定得視實際情形協議增減之(如屬工程於履約期間有不可歸責於技術服務廠商之工程契約變更情形)，並未限定以建造費用百分比法計算協議增減技術服務費用。

# 工程變更之技術服務費用疑義(續)

- 工程之契約變更如屬**不可歸責技術服務廠商**者，如經機關評估、與技術服務廠商**協議**，契約變更部分之技術服務費用依原契約約定之建造費用百分比法計費者，設計服務費與監造服務費給付方式如下：
  - (一)設計服務費：依[工程新增項目及數量追加之建造費用(即該部分機關核定之底價)與原建造費用合計] $\times$ (建造費用百分比) $\times$ (技服契約所定之設計部分占比)計算。
  - (二)監造服務費：依(工程契約變更後金額換算之建造費用) $\times$ (建造費用百分比) $\times$ (技服契約所定之監造部分占比)計算。

# 工程變更之技術服務費用-案例

- 委託設計監造之技術服務案，服務費用採建造費用百分比法：
  - 倘因非可歸責於監造廠商之事由而辦理工程契約變更，監造廠商可否依契約第4條第9款之甲方式，請領延長監造服務期間之監造費用。
  - 如因施工廠商遲延履約致工期延長超過契約工期，監造廠商可否依契約第4條第9款請領延長監造服務期間之監造費用。



# 工程變更之技術服務費用案例(續)

## ○ 技術服務契約範本第4條第9款：

如增加監造服務期間，**未另經協議計價**，且不可歸責於乙方之事由者，應依下列計算式增加監造服務費用（由甲方擇一於招標時載明）：

□甲：(超出『工程契約工期』之日數-因乙方因素增加之日數) / 工程契約工期之日數 \* (監造服務費) \* (增加期間監造人數 / 契約監造人數)

工程契約工期：指該監造各項工程契約所載明之總工期。

□乙依服務成本加公費法計算：

依實際增加之人月，給予甲乙雙方議定之薪資及行政費用；不滿整月者，依所占比率計算。

# 技術服務契約價金案例

- 機關辦理規劃設計監造技術服務案，招標文件載明採「固定費率」，惟議價決標紀錄之服務費用給付誤繕為「固定費用」，其契約價金認定為何？

# 總包價法之技術服務費用-案例1

---

- 機關辦理專案管理(含監造)及統包工程案，專案管理(含監造)係採總包價法，履約期間統包工程因機關需求造成統包工程費增加，委託專案管理(含監造)是否需一併辦理變更追加？

# 總包價法之技術服務費用 (續)

## 技服辦法

第 31 條 服務費用有下列情形之一者，應予另加：

- 一、於設計核准後須變更者。
- 二、超出技術服務契約或工程契約規定施工期限所需增加之監造、專案管理及相關費用。
- 三、修改招標文件重行招標之服務費用。
- 四、超過契約內容之設計報告製圖、送審、審圖等相關費用。

前項各款另加之費用，得按服務成本加公費法計算或與廠商另行議定。

第一項各款另加之費用，以不可歸責於廠商之事由，且經機關審查同意者為限。

第 35 條 機關因故必須變更部分委託服務內容時，得就服務事項或數量之增減情形，調整服務費用及工作期限。但已工作部分之服務費用且機關審查同意者，應核實給付。

# 總包價法之技術服務費用-案例2

- 機關辦理技術服務採購，採總包價法計算服務費用，契約約定結案時須提供工作人員薪資、人月使用情形及短少時應扣款之相關內容，如廠商實際給薪較契約書所載有短少或投入計畫總時數或日數未達原編列標準之情事，機關可否依短少金額於結案時辦理扣款？

# 技術服務契約內容歧異

- 某機關辦理新建工程之委託規劃設計監造案：
  - 契約第2條第2款載明乙方相關工作事項所需經費已包含於服務費用內，其中包括乙方應負責候選綠建築證書、綠建築標章申請之工作事項。
  - 契約第2條附件載明其他如有乙方提供服務，甲方應另行支付費用，其中包括申請公有建築物候選綠建築證書及申請公有建築物綠建築標章。

# 技術服務契約內容歧異(續)

## 契約第1條

三、契約所含各種文件之內容如有不一致之處，除另有規定外，依下列原則處理：

(六)同一優先順位之文件，其內容有不一致之處，屬甲方文件者，以對乙方有利者為準；屬乙方文件者，以對甲方有利者為準。

(七)本契約之附件與本契約內之乙方文件，其內容與本契約條文有歧異者，除對甲方較有利者外，其歧異部分無效。

# 終止契約之建造費用計算

- 某公所辦理技術服務採購已完成細部設計，續規劃以公開招標訂有底價之最低標決標方式辦理工程採購，經首長核定底價後，因政策變更取消採購，並依採購法第48條第1項第7款宣布廢標，不再續辦工程採購。
  - 此時工程底價是否仍應保密？
  - 技術服務係採用建造費用百分比法，設計費應如何計算？
  - 建造費用定義為何？



# 廠商履約期間變更名稱

- 某公所委託設計監造之得標廠商工程顧問公司，於工程施工階段，因公司業務調整變更公司名稱後，得否繼續執行契約權利義務關係？

# 技術規格

## ○ 錯誤行為態樣

- ◆ 抄襲特定廠商之規格資料。
- ◆ 超出需求或與需求無關之規格。
- ◆ 限取得正字標記而未允許同等品競標，或以ISO9000系列驗證證書作為產品規範。
- ◆ 公告金額以上之採購指定進口品。
- ◆ 公告金額以上之採購指定特定廠牌之規格或型號或特定國家或協會之標準而未允許同等品。
- ◆ 刁難廠商使用同等品。

# 技術規格(續)

- 為避免機關辦理工程採購有技術規格限制競爭情形，建議作法如下：(1110100017)
  1. 依機關需求訂定技術規格
  2. 招標文件如可明確載明技術規格，無須再提及參考廠牌
  3. 技術服務廠商訂定技術規格如提及廠牌，應主動向機關說明必要性
  4. 客觀公正審查施工廠商提出之廠牌，並書面具體告知不符之處

# 逾期違約金案例1

- 技術服務廠商履約期間依契約應提送「工作月報」逾期提送，契約未載明違約之罰則。
  - 可否依以契約第13條第1款「未依照契約規定期限完工」計算逾期違約金？
  - 以郵戳為準？送達機關？

# 逾期違約金案例2

- 機關辦理委託規劃設計監造案，得標廠商未能依契約約定「自簽約完成之次日起30日工作天內完成.....」，逾期共計80日曆天，機關依契約第13條第1項第1款約定以建造費總服務費扣罰，廠商認為應以規劃設計之服務費用計算。

## 第十三條 遲延履約

一、逾期違約金，以日為單位（無論日曆天或非日曆天均納入計罰），乙方如未依照契約規定期限完成，應按逾期日數計算下列逾期違約金。若無契約規定提交期程時，則由甲乙雙方書面協議之。

（一）乙方履約工作列入第七條履約期限及附件 2 契約約定權責分工表主要服務項目（未列入者，由甲乙雙方書面協議完成期限）逾期者，經檢討逾期責任可歸責於乙方，每項每逾期 1 日扣罰金額以第二條第一款第（二）目第 1 小目所列建造費之服務費 0.1%計算（取百元整數），於當期計價實付金額內扣罰。

# 逾期違約金案例2(續)

## 公共工程技術服務契約範本←

(109.09.30 版)←

### 第十三條 遲延履約←

一、逾期違約金，以日為單位，乙方如未依照契約規定期限完工，應按逾期日數計算逾期違約金，所有日數（包括放假日等）均應納入，不因履約期限以工作天或日曆天計算而有差別。因可歸責於乙方之事由，致終止或解除契約者，逾期違約金應計算至終止或解除契約之日止。該違約金計算方式：（由甲方擇一於招標時載明）←

- ☐ 每日以新臺幣\_\_\_\_\_元計算逾期違約金。（定額，甲方於招標時載明）←
- ☐ 依逾期工作部分之規劃設計或監造契約價金千分之一計算逾期違約金。（契約文件須分別載明規劃設計及監造之契約價金）←
- ☐ 每日依契約價金總額千分之一（甲方得於招標文件載明其他比率）計算逾期違約金。但未完成履約/初驗或驗收有瑕疵之部分不影響其他已完成部分之使用者，得按未完成履約/初驗或驗收有瑕疵部分之契約價金，每日依其千分之一（甲方得於招標文件載明其他比率；其數額以每日依契約價金總額計算之數額為上限。）計算逾期違約金。←

# 逾期違約金案例3

- 機關委託設計監造技術服務案，契約約定技術服務廠商審定施工廠商依工程契約約定提出整體施工計畫、施工進度、.....等，應於接獲施工廠商資料次日起5日曆天內完成，技術服務廠商於110年2月5日收訖廠商資料，技術服務廠商2月18日審定送達機關，逾期日數如何計算？

		二		月		
日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
	二十	廿一	立春	廿三	廿四	廿五
7	8	9	10	11	12	13
廿六	廿七	廿八	廿九	三十	正月小	初二
14	15	16	17	18	19	20
初三	初四	初五	初六	雨水	初八	初九
21	22	23	24	25	26	27
初十	十一	十二	十三	十四	十五	十六
28						

簡報完畢  
敬請指教
